

| | (A) | Nome | Duração | Início | Fim | Antecessores | Nomes dos Recursos |
|----|------------|---|---------|----------------|----------------|-------------------|------------------------|
| 1 | | TP | 70 dias | 02/09/24 08: | 06/12/24 17:00 | | |
| 2 | | Fase 1 | 65 dias | 02/09/24 08: | 29/11/24 17:00 | | |
| 3 | ★! | Gerenciamento do Projeto | 65 dias | 02/09/24 08: | 29/11/24 17:00 | | Gerência |
| 4 | □ | Definição do escopo do projeto | 4 dias | 02/09/24 08:00 | 05/09/24 17:00 | | |
| 5 | | Definição do cronograma do projeto | 61 dias | 06/09/24 08: | 29/11/24 17:00 | | |
| 6 | ⊌∕ | Estimativas | 2 dias | 06/09/24 08:00 | 09/09/24 17:00 | 4 | |
| 7 | ⊌∕ | Sequenciar atividades | 3 dias | 10/09/24 08:00 | 12/09/24 17:00 | 6 | |
| 8 | | Criação da rede de tarefas | 56 dias | 13/09/24 08:00 | 29/11/24 17:00 | 7 | |
| 9 | ★! | Planejamento e Elaboração | 15 dias | 13/09/24 08: | 03/10/24 17:00 | | Análise e Projeto |
| 10 | ₩ | Criação Documento de Requisitos | 2 dias | 13/09/24 08:00 | 16/09/24 17:00 | 7 | |
| 11 | ✓ | Inspeção Documeto de Requisitos | 2 dias | 17/09/24 08:00 | 18/09/24 17:00 | 10 | SQA |
| 12 | ₩ | Correção do Documento de Requisitos | 2 dias | 19/09/24 08:00 | 20/09/24 17:00 | 11 | |
| 13 | | Casos de Uso | 9 dias | 23/09/24 08: | 03/10/24 17:00 | | |
| 14 | | Definição de Casos de Uso de Alto Nível | 1 dia | 23/09/24 08:00 | 23/09/24 17:00 | 12 | |
| 5 | | Definição de Casos de Uso Expandido | 4 dias | 24/09/24 08:00 | 27/09/24 17:00 | 14 | |
| 16 | | Diagrama de Casos de Uso | 2 dias | 24/09/24 08:00 | 25/09/24 17:00 | 14 | |
| 17 | | Definição de Casos de Uso Real | 4 dias | 30/09/24 08:00 | 03/10/24 17:00 | 15 | |
| 18 | | Construção do modelo conceitual inicial | 4 dias | 24/09/24 08:00 | 27/09/24 17:00 | 14 | |
| 19 | | Diagrama de Sequencia Inicial | 3 dias | 24/09/24 08:00 | 26/09/24 17:00 | 14 | |
| 20 | | Diagrama de colaboração inicial | 3 dias | 27/09/24 08:00 | 01/10/24 17:00 | 14;19 | |
| 21 | ★! | Verificação e Validação do Planejamento e Ela | 4 dias | 04/10/24 08: | 09/10/24 17:00 | | Gerência;SQA;Análise e |
| 22 | | Preparação pra RTF | 1 dia | 04/10/24 08:00 | 04/10/24 17:00 | 15;16;17;18;19;20 | |
| 23 | | Revisão Técnica Formal | 1 dia | 07/10/24 08:00 | 07/10/24 17:00 | 22 | |
| 24 | | Correções dos documentos revisados | 2 dias | 08/10/24 08:00 | 09/10/24 17:00 | 23 | Análise e Projeto |
| 25 | | Fase 2 | 42 dias | 10/10/24 08: | 06/12/24 17:00 | 24 | |
| 26 | ★! | Refinamento de Modelos e Diagramas | 12 dias | 10/10/24 08: | 25/10/24 17:00 | | Análise e Projeto |
| 27 | | Criação e Refinamento Casos de Uso Real | 10 dias | 10/10/24 08:00 | 23/10/24 17:00 | | |
| 28 | | Refinamento Casos de Uso Expandido | 10 dias | 10/10/24 08:00 | 23/10/24 17:00 | | |
| 29 | | Refinamento do Modelo Conceitual | 3 dias | 10/10/24 08:00 | 14/10/24 17:00 | | |
| 30 | | Refinamento dos Diagramas | 12 dias | 10/10/24 08: | 25/10/24 17:00 | | |
| 31 | | Refinamento do Diagrama de Sequência | 6 dias | 10/10/24 08:00 | 17/10/24 17:00 | | |
| 32 | | Refinamento do Diagrama de Colaboração | 12 dias | 10/10/24 08:00 | 25/10/24 17:00 | | |
| 33 | | Criação e Refinamento do Diagrama de Classe | 12 dias | 10/10/24 08:00 | 25/10/24 17:00 | | |
| 34 | ★! | Verificação e Validação dos Refinamentos | 12 dias | 28/10/24 08: | 12/11/24 17:00 | | SQA;Gerência;Análise e |



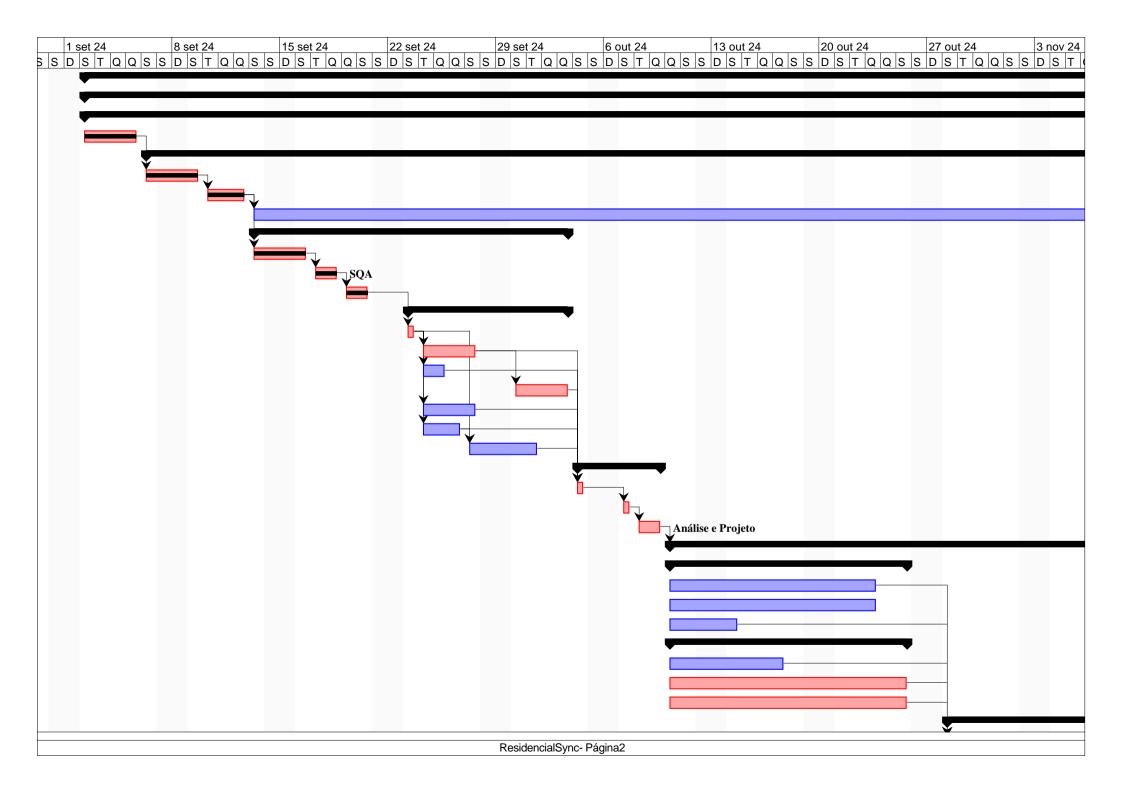

| | ® | Nome | Duração | Início | Fim | Antecessores | Nomes dos Recursos |
|----|-----------|---|---------|----------------|----------------|----------------|--------------------|
| 35 | | Preparação pra RTF | 6 dias | 28/10/24 08:00 | 04/11/24 17:00 | 27;29;31;32;33 | |
| 36 | | Revisão Técnica Formal | 3 dias | 05/11/24 08:00 | 07/11/24 17:00 | 35 | |
| 37 | | Correções dos documentos revisados | 3 dias | 08/11/24 08:00 | 12/11/24 17:00 | 36 | Análise e Projeto |
| 38 | ★! | Construção | 18 dias | 13/11/24 08: | 06/12/24 17:00 | | Codificação |
| 39 | | Implementação | 15 dias | 13/11/24 08: | 03/12/24 17:00 | 37 | |
| 40 | | Codificação de Classes Básicas | 4 dias | 13/11/24 08:00 | 18/11/24 17:00 | | |
| 41 | | Codificação de Métodos Básicos | 5 dias | 13/11/24 08:00 | 19/11/24 17:00 | | |
| 42 | | Codificação de Controladores | 10 dias | 20/11/24 08:00 | 03/12/24 17:00 | 40;41 | |
| 43 | | Codificação da interface | 10 dias | 13/11/24 08:00 | 26/11/24 17:00 | | |
| 44 | | Populando JSONS para usar no carregamento | 1 dia | 13/11/24 08:00 | 13/11/24 17:00 | | |
| 45 | | Codificação do carregamento dos JSONS nos cat | 4 dias | 14/11/24 08:00 | 19/11/24 17:00 | 44 | |
| 46 | | Codificação dos Metodos dos Catalogos | 10 dias | 13/11/24 08:00 | 26/11/24 17:00 | | |
| 47 | | Verificação e Validação Da Construção | 3 dias | 04/12/24 08: | 06/12/24 17:00 | 39 | |
| 48 | | Preparação pra RTF | 1 dia | 04/12/24 08:00 | 04/12/24 17:00 | 42;43;44;45;46 | |
| 49 | | Revisão Técnica Formal | 1 dia | 05/12/24 08:00 | 05/12/24 17:00 | 48 | |
| 50 | | Correções dos artefatos revisados | 1 dia | 06/12/24 08:00 | 06/12/24 17:00 | 49 | |
| 51 | ★! | Avaliação e Testes | 30 dias | 10/10/24 08: | 20/11/24 17:00 | | SQA |
| 52 | | Definição de Casos de Teste | 20 dias | 10/10/24 08:00 | 06/11/24 17:00 | | |
| 53 | | Execução de Testes e Ajustes | 10 dias | 07/11/24 08:00 | 20/11/24 17:00 | 52 | |

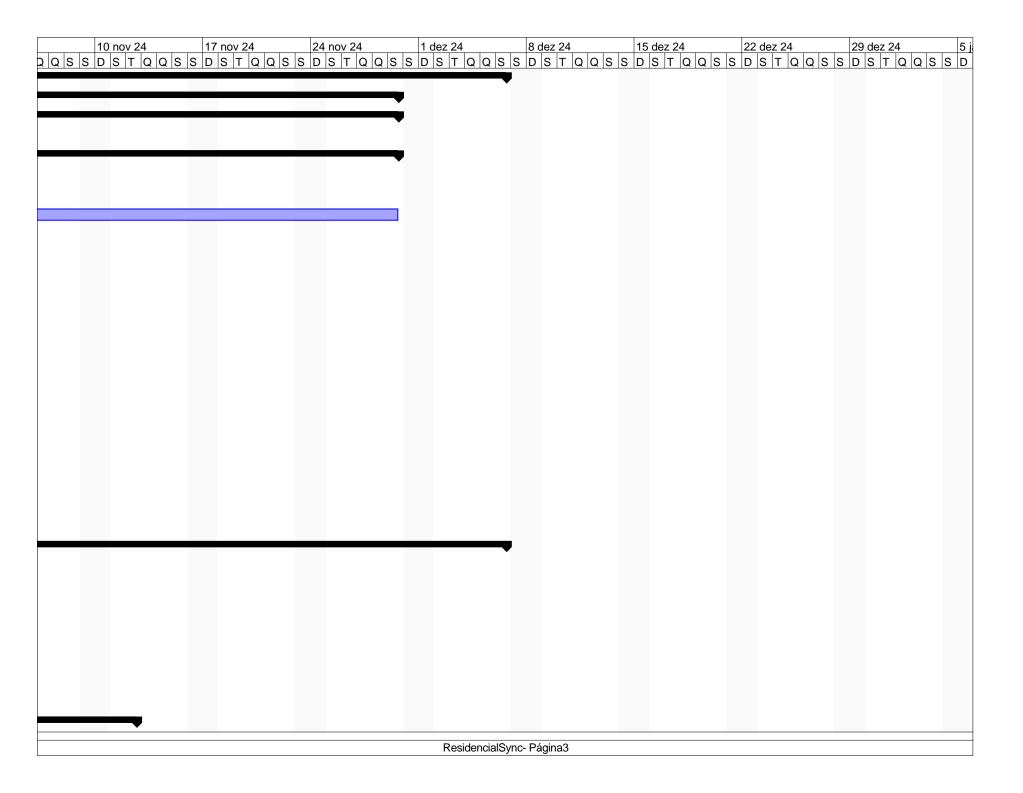
